


বিষয়: চলমান প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইড-এ প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত চলমান প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও ক্রয়-পরিকল্পনা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইড-এ প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	মেয়াদকাল
০১।	বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।	৪৫১৪.৬০ লক্ষ টাকা	জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২২
০২।	কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	৩৮৪৩.৩০ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২২
০৩।	কুমিল্লা সার্কিট হাউজ সম্প্রসারণ।	৩৬৪০.৪৩ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর-২০২১
০৪।	খুলনা শহরে এডমিনিস্ট্রেটিভ কনভেনসন সেন্টার নির্মাণ।	১৪৬২৭.৬৭ লক্ষ টাকা	জানুয়ারি ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২১
০৫।	খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন কার্যালয় ভবন ও অডিটোরিয়াম নির্মাণ।	১৩৯৪৫.৫১ লক্ষ টাকা	এপ্রিল ২০১৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২১

সংযুক্তি: ২৬ (ছাব্বিশ) পাতা।


(একেএম আবুল কালাম আজাদ)
উপসচিব
ফোন:৯৫৪৫৩৮১

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
পিএসিসি
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

- ১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
- ২। উপসচিব
উন্নয়ন শাখা
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

সংযোজনী-৩ (ক)

সূত্র:পিপিআর, ২০০৮

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি,
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেটর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস জিওবি	প্রকল্পিত বায় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
GD-2	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১০.৩৬	16 Aug 21	11 Oct 21	15 Nov 21
GD-6	মেডিক্যাল সেন্টারের জন্য যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021
GD-7	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেম ও ওয়াল ডিসপ্লে)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১৯৭.১৮	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-8	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (ক্রাশরুমে সাউন্ড সিস্টেম)	সংখ্যা	১	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.০৫	30 Sep 2021	30 Nov 2021	28 Feb 2022
GD-9	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি (লিফট)	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৪১.৭৭	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-10	কম্পিউটার সফটওয়্যার	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	১০.৩১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-11	শিক্ষাদান এবং শেখার উপকরণ	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	১০.০১	31 Aug 2021	31 Oct 2021	31 Mar 2022
GD-12	বইপত্র ও সামগ্রিকী	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021
GD-13	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	01 August 21	01 Sept 21	30 Sept 2021
ক্রয়কৃত পণ্যের মোট মূল্য =							৩২৫.৬৮			

২২/০৬/২১

২২/০৬/২১

২২/০৬/২১

সংযোজনী-৩ (খ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮


২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেক্টর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)


প্রকল্প বায় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত বায় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
WD-3	পাঁচ ডলা ডরমিটরী ভবন সংস্কার (ভবনের এলাট পেনেল, ফ্লোর ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, এসপিডিবি, কম্প্রোল সিস্টেমের ইলেকট্রিফিকেশন কাজ)	সংখ্যা	তালিকা অনুযায়ী	OTM	HOPE/PD	জিওবি	৭৪.৬৩	-	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
পূর্ত কাজের বোর্ড ক্রয়মূল্য =							৭৪.৬৩	-			


27.06.21

ড. মোঃ মাসুদ হুসাইন
উপ-সচিব (প্রশাসনিক)
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি, সক্ষমতা
বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
শাহাবুদ্দীন, ঢাকা


27.06.21

মোঃ মাসুদ হুসাইন
সচিব (প্রশাসনিক)
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি
সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প


27.06.2021

আবদুল মোহাম্মদ
কেম (সিনিয়র)

সংযোজনী-৩ (গ)

সূত্র: পিপিআর ২০০৮

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেস্টুর (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-1	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিকাশ (আইন ও প্রশাসন কোর্স)	-	থোক	QCBS	HOPE/PD	জিওবি	৭০.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-2	ইংরেজি ভাষায় পেশাগত উন্নয়ন এবং ফেকাল্টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	২০ জন ০১ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	১৫.৮০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-3	ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কোর্স	জন-ব্যাচ	৮০ জন ০৪ ব্যাচ	SSS	HOPE/PD	জিওবি	৬৫.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-4	আইসিটি/ইগভর্নেন্স (ইন্টিগ্রেটেড ইআরপি সিস্টেম)	-	থোক	SSS/RFQM	HOPE/PD	জিওবি	৫.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
SD-8	অনুষদ সদস্যদের টিওটি প্রশিক্ষণ (বিদেশে) (৪ ব্যাচ = ২৮ জন)	জন-ব্যাচ	১৪ জন ০২ ব্যাচ	QCBS/SSS	HOPE/PD	জিওবি	১০০.০০	July 2021	16 Aug 21	11 Oct 21	31 Mar 2022
সেবার মোট ক্রয়মূল্য =							২৪৫.৮০	-			

২৭.০৬.২১
ড. মোঃ মঈন উদ্দিন
উপ প্রকল্প পরিচালক
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি
কম্পিউটার রুম ১০৭, বিটা এলডি
শাহবাগ, ঢাকা।

২৭.০৬.২১
মোট মঞ্জুরকরণ হিসাব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি
সক্ষমতা বৃদ্ধি ক্রয় প্রকল্প

২৭.০৬.২০২১
অক্ষয় মেহতা
মোট (সিটি)

সংযোজনী

২০২১-২২ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একাডেমি
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক ও রেকর্ডার (কোড: ১০৭০২)
প্রকল্প / কার্যক্রমের নাম ও কোড	"বিসিএস প্রশাসন একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (১ম সংশোধিত)" (কোড: ২২৪০০১৪০০)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	: ৪৫১৪.৬০
জিওবি	: ৪৫১৪.৬০
নিজস্ব অর্থ	

প্যাকেজ নং	ডিপিপি /টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞপ্তি আহ্বান /শুরু	চুক্তি স্বাক্ষর	সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
SD-9	বিদেশে মানস্টার্স প্রোগ্রাম	জন-ব্যাচ	১৩ জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৬৫০.০০	-	20 July 21	Sep 21	Oct-2021
SD-10	গবেষণা/উদ্ভাবনী ব্যয়	জন-ব্যাচ	২০জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৩০.০০	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-11	সেমিনার কনফারেন্স	জন-ব্যাচ	২০০ জন ০৫ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১০.০০	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-12	মর্ডান অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স (৪ দিন)	জন-ব্যাচ	৫০ জন ০২ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	৮.৩৯	-	20 July 21	-	31 Mar 2022
SD-13	গভর্ন্যান্স আইটি ও ম্যানেজমেন্ট কোর্স (১০ দিন)	জন-ব্যাচ	২০ জন ০২ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১২.৭৯	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
SD-14	প্রফেশনাল ডেভেলোপমেন্ট কোর্স (১০ দিন)	জন-ব্যাচ	১৫ জন ০১ ব্যাচ	-	HOPE/PD	জিওবি	১৩.১১	-	16 Aug 21	-	31 Mar 2022
সেবার মোট ক্রয়মূল্য =							৭২৪.২৯	-			

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া
ফোন ০৭১-৬২৪৭০ ও ফ্যাক্স- ৬২৭২৯।
E-mail- ee_khsht@pwd.gov.bd.



7 8 MAR 2021

আপলো কৃত

স্মারক নং: ২৫.৩৬.৫০০০.২৪০.২৪.০১৮.২১/০০৮

তারিখ: ০৯/০২/২০২১ বঙ্গাব্দ।
২৬/০৬/২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্পের ওয়াক প্লান প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্পের ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত ওয়াক প্লান সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ওয়াক প্লান-২(দুই) পাতা।

উপ-সচিব
পরিকল্পনা কোষ-১
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডাঃ হুমায়ুন কবীর
(আবু হায়াত মুহাম্মদ শাকিউল আজম)
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া।

ও
প্রকল্প পরিচালক
কুষ্টিয়া সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প
কুষ্টিয়া।

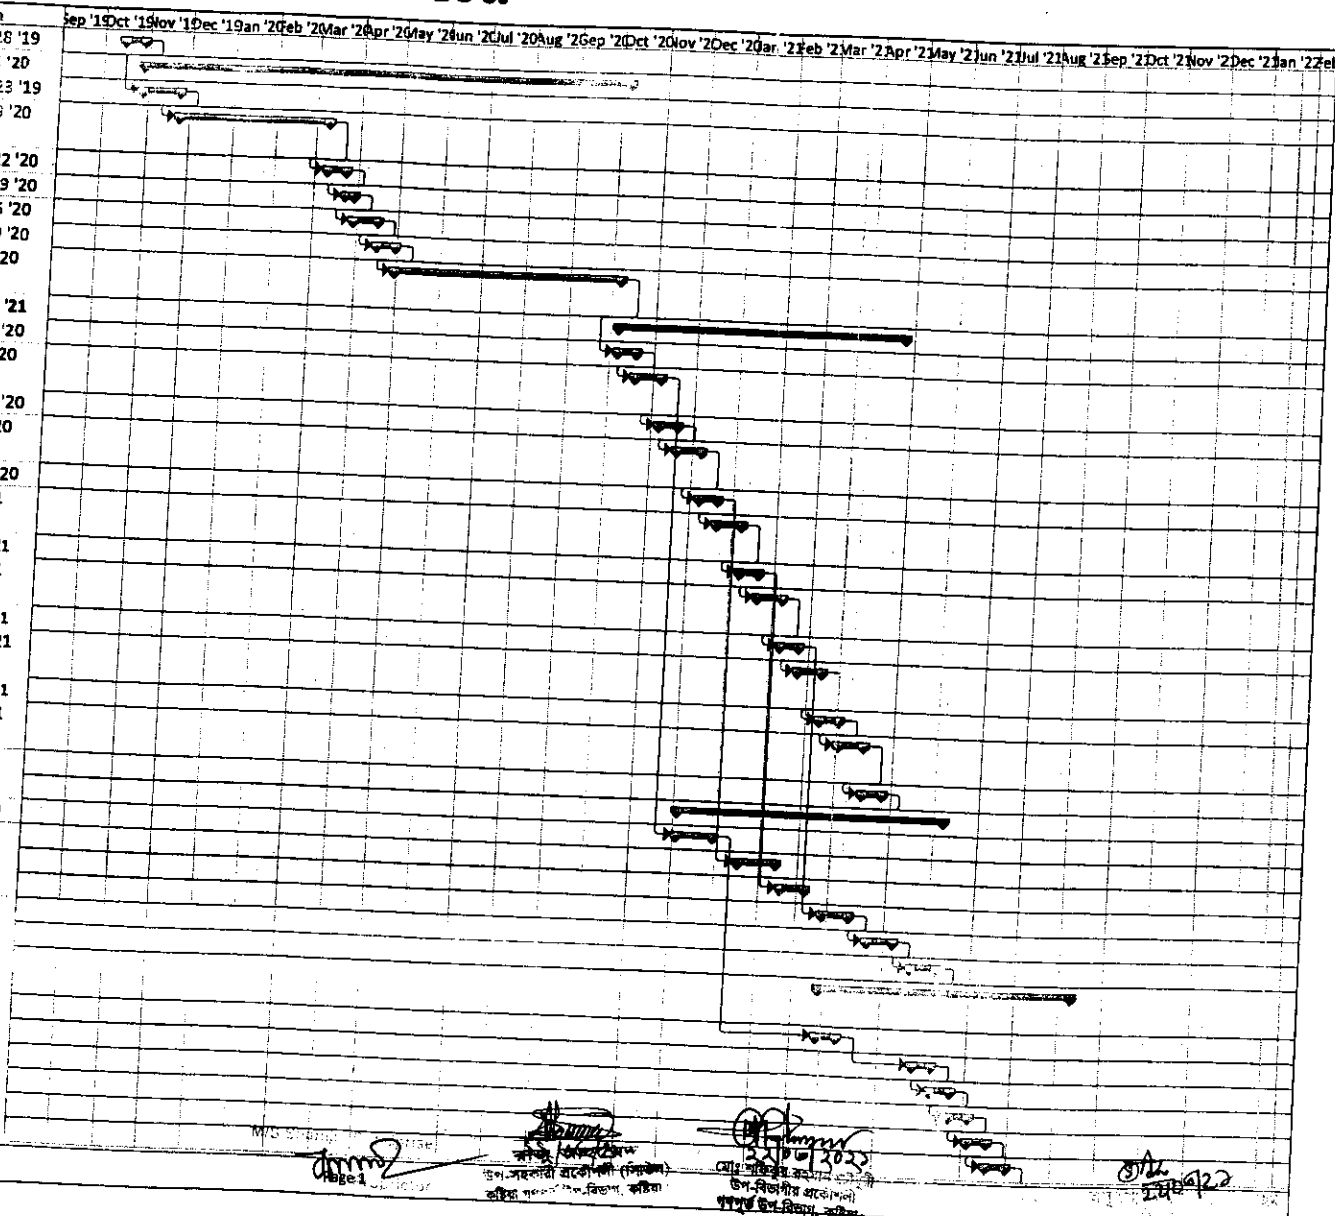
সদয় জ্ঞাতার্থে :-



- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা গণপূর্ত জোন, খুলনা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প সার্কেল-১, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।
- ৪। জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া ও সভাপতি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, কুষ্টিয়া জেলায় নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প, কুষ্টিয়া।
- ৫। অফিস নথি।

২

Work Schedule For Construction of New Circuit House at Kushtia District.

ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Site Mobilization works	15 days	Oct 15 '19	Oct 28 '19
2	Foundation Works	387 days	Oct 28 '19	Oct 6 '20
3	Earth Work for Foundation	30 days	Oct 28 '19	Nov 23 '19
4	Preparation for Foundation(CC works)(Delay due to heavy works)	120 days	Nov 24 '19	Mar 9 '20
5	Rod Binding For Mat Foundation	15 days	Mar 9 '20	Mar 22 '20
6	Casting of Mat	7 days	Mar 23 '20	Mar 29 '20
7	Casting of Short Column	20 days	Mar 29 '20	Apr 15 '20
8	Earth Filling	15 days	Apr 16 '20	Apr 29 '20
9	Casting of Grade Beam(Delay Due to Covid-19 situation)	180 days	Apr 29 '20	Oct 6 '20
10	Super Structure Works	225 days	Oct 6 '20	Apr 24 '21
11	Casting of Ground floor Column	15 days	Oct 6 '20	Oct 19 '20
12	Shuttering, Centering and Casting of Ground Floor Slab	20 days	Oct 19 '20	Nov 6 '20
13	Casting of 1st floor Column	15 days	Nov 6 '20	Nov 19 '20
14	Shuttering, Centering and Casting of 1st Floor Slab	20 days	Nov 19 '20	Dec 7 '20
15	Casting of 2nd floor Column	15 days	Dec 7 '20	Dec 20 '20
16	Shuttering, Centering and Casting of 2nd Floor Slab	20 days	Dec 20 '20	Jan 7 '21
17	Casting of 2nd floor Column	15 days	Jan 7 '21	Jan 20 '21
18	Shuttering, Centering and Casting of 3rd Floor Slab	20 days	Jan 21 '21	Feb 7 '21
19	Casting of 3rd floor Column	15 days	Feb 7 '21	Feb 21 '21
20	Shuttering, Centering and Casting of 4th Floor Slab	20 days	Feb 21 '21	Mar 10 '21
21	Casting of 4th floor Column	15 days	Mar 10 '21	Mar 24 '21
22	Shuttering, Centering and Casting of 5th Floor Slab	20 days	Mar 24 '21	Apr 10 '21
23	Casting of 5th floor Column	15 days	Apr 11 '21	Apr 24 '21
24	Brick Works	210 days	Dec 3 '20	Jun 7 '21
25	Ground Floor	30 days	Dec 3 '20	Dec 29 '20
26	1st Floor	30 days	Jan 16 '21	Feb 12 '21
27	2nd Floor	20 days	Feb 16 '21	Mar 6 '21
28	3rd Floor	20 days	Mar 19 '21	Apr 6 '21
29	4th Floor	20 days	Apr 19 '21	May 7 '21
30	5th Floor	20 days	May 21 '21	Jun 7 '21
31	Inside Plaster, Window Grill and Door Chowkath works	195 days	Mar 19 '21	Sep 9 '21
32	Ground Floor	15 days	Mar 19 '21	Apr 2 '21
33	1st Floor	15 days	May 25 '21	Jun 7 '21
34	2nd Floor	15 days	Jun 7 '21	Jun 21 '21
35	3rd Floor	15 days	Jun 21 '21	Jul 4 '21
36	4th Floor	15 days	Jul 4 '21	Jul 17 '21
37	5th Floor	15 days	Jul 17 '21	Jul 31 '21




Md. Anwarul Hossain
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 কুমিল্লা মহানগরী বিধান, কুমিল্লা


২০/০৭/২০২১
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 কুমিল্লা মহানগরী বিধান, কুমিল্লা


১২/০৭/২১

Work Schedule For Construction of New Circuit House at Kushtia District.

Name	Duration	Start	Finish	sep '19	Oct '19	Nov '19	Dec '19	Jan '20	Feb '20	Mar '20	Apr '20	May '20	Jun '20	Jul '20	Aug '20	Sep '20	Oct '20	Nov '20	Dec '20	Jan '21	Feb '21	Mar '21	Apr '21	May '21	Jun '21	Jul '21	Aug '21	Sep '21	Oct '21	Nov '21	Dec '21	Jan '22		
Outside Plaster(All Floors)	45 days	Jul 31 '21	Sep 9 '21																															
Paint and Marble Works	120 days	May 25 '21	Sep 9 '21																															
Ground Floor	20 days	May 25 '21	Jun 12 '21																															
1st Floor	20 days	Jun 12 '21	Jun 29 '21																															
2nd Floor	20 days	Jun 30 '21	Jul 17 '21																															
3rd Floor	20 days	Jul 17 '21	Aug 4 '21																															
4th Floor	20 days	Aug 4 '21	Aug 22 '21																															
5th Floor	20 days	Aug 22 '21	Sep 9 '21																															
Primary Pipe Networking	60 days	Jun 7 '21	Jul 31 '21																															
Finishing Works	60 days	Sep 22 '21	Nov 14 '21																															
Roofing and Aluminium	20 days	Nov 28 '21	Dec 15 '21																															
Roofing	15 days	Dec 15 '21	Dec 29 '21																															
Roofing Fittings Installation	15 days	Dec 15 '21	Dec 29 '21																															
Roofing and Internal	270 days	Apr 24 '21	Dec 20 '21																															
Roofing and Internal Roofing, Air Conditioning(AC, PABX, Solar Panel, Fire Extinguisher, Generator and Security light, Fire Alarm System, CCTV System	270 days	Apr 24 '21	Dec 20 '21																															
Roofing Finishing Works of Main	15 days	Dec 20 '21	Jan 2 '22																															
Roofing																																		
Roofing Works of Garage and Police	365 days	Jan 1 '21	Nov 21 '21																															
Roofing Work																																		
Roofing Path, Walkway, Internal RCC	90 days	Jul 31 '21	Oct 19 '21																															
Roofing Site Development and other works																																		
Roofing Tube well and Distribution	90 days	Jul 31 '21	Oct 19 '21																															
Roofing House and Underground	90 days	Jul 31 '21	Oct 19 '21																															
Roofing Reservoir																																		
Roofing Transformer and Substation	180 days	Jul 31 '21	Jan 7 '22																															
Roofing Works																																		
Roofing Project Handover	180 days	Jul 31 '21	Jan 7 '22																															
Roofing	15 days	Jan 7 '22	Jan 20 '22																															

M/S Ghanshyam Engineering

 23/06/2021
 প্রকল্প পরিচালক
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 কুষ্টিয়া সদর উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া


 23/06/2021
 মোঃ ফারুক রহমান চৌধুরী
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 কুষ্টিয়া সদর উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।


 23/06/21
 মোঃ ফারুক রহমান চৌধুরী
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী
 কুষ্টিয়া সদর উপ-বিভাগ, কুষ্টিয়া।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া
ফোন ০৭১-৬২৪৭০ ও ফ্যাক্স- ৬২৭২৯।
E-mail- ee_khsht@pwd.gov.bd.



স্মারক নং : ২৫.৩৬.৫০০০.২৪০.১৪.০১৮.২০- ১৪০৮


তারিখ: ০৬/০৭/২৪২৪ বঙ্গাব্দ।
১৪/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : কুষ্টিয়া জেলার নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে যথাযথ সম্মানের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, কুষ্টিয়া জেলার নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

বরাবর,

উপ-সচিব,
পরিকল্পনা, কোষ-১,
জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


(মোঃ জাফরুল ইসলাম)
নির্বাহী প্রকৌশলী
কুষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কুষ্টিয়া
ও
প্রকল্প পরিচালক
কুষ্টিয়া জেলার নতুন সার্কিট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :-


- ১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রকল্প সার্কেল-১, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, ঢাকা।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর গণপূর্ত সার্কেল, যশোর।
- ৩। উপ-সচিব, পরিকল্পনা, কোষ-৩, জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (FY 2021-2022)

Ministry/Division	Ministry of Public Administration	
Agency	Public Works Department	
Procuring Entity Name & Code	Executive Engineer, Kushtia Public Works Division, Kushtia	
Project/Programme Name & Code	New Circuit House Building in Kushtia City	224282300
Project Implantation Periods		


Project Cost (In Lac Taka)	
Total	3843.30
GOB	3843.30
PA	

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time In Contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Works																	
WD-1	Soil Test			LTM	DOFP	GOB	6.00	Planned Date		01/01/2019					01/02/2019		30 Days
								Planned Days									30 Days
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		30 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days		95 Days



 ১৮/০৬/২০১৯

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কৃষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD-2	6 Storied Circuit House Building with 6 Storied Foundation(Foundation, Super Structure, Internal Water Supply & Sanitation, Internal Electrification)	Sqm	474 3.96	OTM	DOFP	GOB	1733.4 8	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days							90 Days		
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		480 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	
	2 Storied Building with 3 Storied Foundation(Sub-station & Garrage at Ground Floor & Police Barrack at 1 st Floor)	Sqm	371. 6	OTM	DOFP	GOB	154.50	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days							90 Days		
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		480 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	


 Md. Zahidul Karim
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কুষ্টিয়া গণপুর্ন বিভাগ কুষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
W2	External Water Supply	Gal	200 00	OTM	DOFP	GOB	45.40	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days								90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		225 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	
External Electrification																	
	300 KVA Electric Sub-station & Equipment	Set	1	OTM	DOFP	GDB	84.00	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days								90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		255 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	
	250 KVA Generator (ATS with Canopy)	Set	1	OTM	DOFP	GOB	75.00	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days								90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		255 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	


 মাঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 পটুয়া গণপুত্র বিভাগ, কুষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W2	1000Kg Passenger Lift	Nos	1	OTM	DOFP	GOB	80.00	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days	
								Planned Days									90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		60 Days	
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days		
	Pump Motor	Set	2	OTM	DOFP	GDB	12.00	Planned Date		01/03/2019						01/06/2019		600 Days
								Planned Days									90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		60 Days	
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days		
	Air Cooler(Split/ Window)	Ton	160	DTM	DOFP	GOB	215.00	Planned Date		01/03/2019						01/06/2019		600 Days
								Planned Days									90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		60 Days	
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days		


 26/06/2019
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ, কৃষ্টিয়া।


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
৯২	Geyser	Nos	40	OTM	DOFP	GOB	10.00	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days								90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		60 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days	
	PABX/Interc om System	Job	OTM	DOFP	GDB	12.00	Planned Date		01/03/2019						01/06/2019		600 Days
							Planned Days								90 Days		
							Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		60 Days	
							Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days		
	On Grid Solar System	K- Wt	15	OTM	DOFP	GOB	30.00	Planned Date		01/03/2019					01/06/2019		600 Days
								Planned Days								90 Days	
								Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019		40 Days
								Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	11 Days	95 Days	


 ১৬/০৬/২০১৯
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপত্র বিভাগ কৃষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (in Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W2	Fire Extinguisher, Compound & Security Light	Job	OTM	DOFP	GOB	30.00	Planned Date		01/03/2019						01/06/2019		600 Days	
							Planned Days										90 Days	
							Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019			60 Days	
							Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days			
	Conference System, CCTV, Networking/ LAN, Earthing System	Job	DTM	DOFP	GOB	25.00	Planned Date		01/03/2019							01/06/2019		600 Days
							Planned Days										90 Days	
							Actual Date		24/06/2019	28/07/2019	01/09/2019	02/09/2019	09/09/2019	29/09/2019			60 Days	
							Actual Days			34 Days	33 Days	01 Day	07 Days	21 Days	95 Days			
	Ancillary Works	Job					Planned Date		01/03/2019							01/06/2019		600 Days
							Planned Days										90 Days	
							Actual Date											
							Actual Days											


 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপত্র বিভাগ কৃষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (in Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
WD-3	Arboriculture/Landscaping		Job	OTM	DOFP	GOB	25.00	Planned Date		01/08/2020					01/11/2020		180 Days		
								Planned Days								90 Days			
								Actual Date											
								Actual Days											
WD-4	Boundary Wall	m	1425	OTM	DOFP	GOB	275.28	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days		
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days			
								Actual Date											
								Actual Days											
	Security Post & Gate		Job		OTM	DOFP	GOB	30.00	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
									Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
									Actual Date										
									Actual Days										


 মাঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপূর্ত বিভাগ কষ্টিয়া


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W4	Independent Plaza		Job	OTM	DOFP	GOB	25.00	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										
	Saluting Dias		Job	OTM	DOFP	GOB	3.00	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										
	Kitchen		Job	OTM	DOFP	GD8	31.33	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										


 ১৬/১০/২০২১
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপত্র বিভাগ কৃষ্টিয়া

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd In GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
W4	Establishment of Small Water Fountain Inside the Garden		Job	OTM	DOFP	GOB	35.00	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										
WD-5	Demolition & Removal of Existing Circuit House	sqm	56	OTM	DOFP	GOB	5.00	Planned Date		01/01/2022	28/01/2022	25/02/2022	30/02/2022	9/03/2022	15/03/2022		90 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	10 Days	6 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										


 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কৃষ্টিয়া গণপত্র বিভাগ কৃষ্টিয়া

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (In Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-1	Furniture & Interior Decoration		Job	OTM	DOFP	GOB	575.00	Planned Date		01/10/2021	28/10/2021	25/11/2021	30/11/2021	10/12/2021	15/12/2021		180 Days	
								Planned Days			28 Days	27 Days	5 Days	11 Days	5 Days	75 Days		
								Actual Date										
								Actual Days										
GD-2	Computer Accessories (PWD Field Office(Civil & E/M),Architect & Project Office)	Nos	3				3.00	Planned Date										
								Planned Days										
								Actual Date										
								Actual Days										


 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 দ্বিতীয় গণপুত্র বিভাগ কটকট


Package No	Description of Procurement Package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd Cost (in Lac Tk.)	Time Code for Process	Not Rsd in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time in Contract Signature	Time Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GD-3	Stationary Accessories (PWD,DOA)		Job				2.00	Planned Date	Within the Whole Project Period										
								Planned Days											
								Actual Date											
								Actual Days											



Md. Zahidul Islam
Executive Engineer
Kushtia Public Works Division,
Kushtia.

Work plan for "Construction of New Office Building & Auditorium for Divisional Commissioner, Khulna." 2021-2022


Sl. No	Task Name	Upto June/21	July/21	Agu/21	Sep/21	Oct/21	Nov/21	Dec/21	Jan/22	Feb/22	Mar/22	Apr/22	May/22	June/22	July/22	Agu/22	Sep/22	Oct/22	Nov/22	Dec/22	Jan/23	Feb/23	Mar/23	Apr/23	May/23	June/23	
০১.	মূল অফিস ভবন (১০ তলা) অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন																										
০২.	১টি দ্বিভল অডিটোরিয়াম																										
০৩.	সুপারভাইজার																										
০৪.	পাম্প হাউজ																										
০৫.	পানি সরবরাহ লাইন																										
০৬.	কম্পাউন্ড ড্রেন																										
০৭.	আরসিসি রাক্তা																										
০৮.	সীমানা প্রাচীর (সেটসহ)																										
০৯.	ওয়াকওয়ে ও গাইড ওয়াল নির্মাণ																										
১০.	১০০০ কেজিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন ও যন্ত্রপাতি																										
১১.	ডিজেল জেনারেটর																										
১২.	১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার লিফট ০৩ টি ১০০০ কেজি বেড লিফট ০১ টি																										
১৩.	পাম্প মটর																										
১৪.	আসবাবপত্র সরবরাহ অডিটোরিয়াম ও সেমিনার হল																										
১৫.	বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন																										
১৬.	আরবরিকালচার																										


 (মোঃ লুৎফুল ইসলাম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১

2021-22

Work plan for "Construction of New Office Building & Auditorium for Divisional Commissioner, Khulna."

Sl. No	Task Name	Duration	Start	Finish	Remark
০১.	মূল অফিস ভবন (১০ তলা) অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন	20 Months	May/21	December/22	
০২.	১টি দ্বিতল অডিটোরিয়াম	23 Months	May/20	March/22	
০৩.	ভূগর্ভস্থ জলাধার	05 Months	March/22	July/22	
০৪.	পাম্প হাউজ	05 Months	March /22	July/22	
০৫.	পানি সরবরাহ লাইন	07 Months	March/22	September/22	
০৬.	কম্পাউন্ড ড্রেন	06 Months	September/22	February/23	
০৭.	আরসিসি রাস্তা	06 Months	September/22	February/23	
০৮.	সীমানা প্রাচীর (গেটসহ)	08 Months	May/22	December /22	
০৯.	ওয়াকওয়ে ও গাইড ওয়াল নির্মাণ	08 Months	June/22	January/23	
১০.	১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন ভবন ও যন্ত্রপাতি	11 Months	December /21	October/22	
১১.	ডিজেল জেনারেটর	07 Months	December/21	June/22	
১২.	১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার লিফট ০৩ টি ১০০০ কেজি বেড লিফট ০১ টি	13 Months	October/21	October /22	
১৩.	পাম্প মটর	05 Months	May/22	September/22	
১৪.	আসবাবপত্র সরবরাহ অডিটোরিয়াম ও সেমিনার হল	07 Months	September/22	March/23	
১৫.	বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন	09 Months	January/22	September/22	
১৬.	আরবরিকালচার	04 Months	March/2023	June/2023	


 (মোঃ নাজিমুল ইসলাম)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১
 খুলনা।

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
সংস্থা	: গণপূর্ত অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১,
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	: খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের নতুন ভবন এবং অডিটরিয়াম নির্মাণ

মোট ১৩,৯৪৫.৫১
জিওবি ১৩,৯৪৫.৫১
নিজস্ব অর্থ

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজে বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কাজ (W-3)	বহিঃস্থ বিদ্যুতায়ন :										
	শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ:	টন	৫৫৫	ওটিএম	ডিওএফপি	জিওবি	১০৩৫.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২০২১	১৫/০১/২০২২	২০/০৯/২০২২
	পিএবিএল ও ইন্টারকম সিস্টেম		থোক								
	কনফারেন্স ও মান্টি মিডিয়া সিস্টেম		থোক								
	টেক্স লাইট, সাউন্ড এন্ড পিএ সিস্টেম		থোক								
	সৌর বিদ্যুৎ	কিলোওয়াট	২৪								
	অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা (ফায়ার ডোরসহ)	সংখ্যা	১০								
	সিসিটিভি	সেট	৭৫								
	কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং		থোক								
	ফোর্সড ভেন্টিলেশন সিস্টেম, কম্পাউন্ড ও সিকিউরিটি লাইট, সার্জ প্রটেকশন সিস্টেম		থোক								
	সাইন বোর্ড, এক্সেস কন্ট্রোল ডিভাইস, মেটাল ডিটেক্টর		থোক								
	অন্যান্য (স্কাফোল্ডিং টুলস, বিভিন্ন অটোমেশন, ডি হিউমিডিফায়ার, জরুরী ক্যাবল ও ফিটিংস ইত্যাদি		থোক								

২১/০৮/২০২১
(মোঃ লতিফুল ইসলাম)

নির্বাহী প্রকৌশলী
খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১

প্রতি স্বাক্ষরিত
নির্বাহী প্রকৌশলী
খুলনা গণপূর্ত বিভাগ-১

Work Programme

Name of work : Extension of Existing circuit house at cumilla.

SI No	Description of work.	Sep. 2020				Oct. 2020				Nov. 2020				Dec. 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tiles work																
2	Granite /Marble work																
3	Brick cladding																
4	In side plaster																
5	Out side plaster																
6	Verandah Railing																
7	In & Out side painting																
8	Internal Sanitary																
9	Internal Electrification																
10	Gas Connection with fees																
11	Interior Decoration																
12	RCC Boundary wall with gate																
13	RCC Road																
14	External Sanitary & Water Supply																
15	Drain & apron																
16	Construction of Garrage, driver, Police Barrack Guard shed.																
17	Solar panel																
18	External Electrification Work																
19	Installation of 100kg (13 Passenger) 6-stop passenger Lift																
20	Furniture (including international standard of VVIP room)																
21	Gymnasium including related instruments																
22	Arboriculture (including on porch and roof top)																
23	Sub-Station Building																
24	Construction of RCC Connecting way																
25	Cleaning & Washing																

[Signature]
07/09/2021
মোঃ আব্দুল আনোয়ার হোসাইন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, কুমিল্লা


[Signature]
07/09/2021
মোঃ আনোয়ারুল আলিম মজুমদার
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (ই/এম)
গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, কুমিল্লা


[Signature]
09/10/21
মোঃ আব্দুল সাত্তার
মির্জাপুরী প্রকৌশলী
কুমিল্লা গণপূর্ত বিভাগ
কুমিল্লা

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR CUMILLA CIRCUIT HOUSE EXTENSION PROJECT

Ministry/Division	: Ministry of Public Administration
Agency	: PWD & DOA.
Procuring Entity Name & Code	: Executive Engineer, Comilla P.W.D Division, Comilla.
Project / Programme Name & Code	কুমিল্লা সার্কিট হাউস সম্প্রসারণ প্রকল্প।

Package No.	Description of procurement package as per PP/TAPP	Unit	Quantity	Procurement method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of funds	Estd. cost (Taka in Lac)	Indicative Dates		
								Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
	GOODS									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GD-06	Gymnasium including related instruments	No	19	RFQ	as per DOFP	GOB	35.57	15-Sep-2021	15-Oct-21	20-Dec-21


 ৬/১২/২১
 মোঃ ইউছুফ সাকিব
 সহকারী প্রকৌশলী
 গণপুত্র বিভাগ, কুমিল্লা।


 ৬/১২/২১
 মোঃ আব্দুল সালাম
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কুমিল্লা গণপুত্র বিভাগ
 কুমিল্লা।
